



PROPUESTA DE PROYECTO · SERVICIO DE HABILIDADES

Producción del contenido de lanzamiento de N58

con Claude y una Skill propia

Este proyecto produce los **creativos** y los artículos de posicionamiento en buscadores (SEO) del lanzamiento de N58, y deja a 1 persona de Mercadeo con una **Skill** de Claude con la marca del banco para seguir produciendo por su cuenta.

3

personas en Mercadeo para un lanzamiento completo: gerencia, Instagram y apoyo operativo.

100%

digital: el banco debe llegar a un público acostumbrado a ir a la agencia.

SEO

reputacional sin gestión activa: hoy no se controla qué aparece primero al buscar la marca.

Fuente: Ficha de Levantamiento de N58 (01/10/2026).

CÓDIGO: CAI-034

N58

Contenido para el lanzamiento y una Skill propia.

Producimos **más de 50 creativos** y **4 artículos**, dentro del calendario de lanzamiento ya en marcha del banco.

CLAUDE

6 entregables · 3 etapas

Fundamentals

Claude aplicado a creativos y artículos.



1

Construcción

Creativos y artículos del lanzamiento, con 3 revisiones.



3

Implementación

Skill con la marca, probada con casos reales.



2

CÓMO TRABAJAMOS

- 1 Levantamos marca, calendario y productos prioritarios en el kick-off.
- 2 Nivelamos a Mercadeo en Claude, aplicado a creativos y artículos.
- 3 Producimos creativos y artículos y los revisamos con Mercadeo.
- 4 Construimos con 1 persona la Skill y medimos a 30, 60 y 90 días.

QUIÉN CONSTRUYE


Intezia produce los creativos y los artículos con la marca de N58 y construye con 1 persona de Mercadeo la Skill, un conjunto de instrucciones reutilizables de Claude.

FUERA DE ESTE ALCANCE

- Las licencias de Claude: no se incluyen en esta propuesta.
- Formar a más de una persona: la Skill se construye con 1 persona designada de Mercadeo.

Del kick-off a una Skill propia, en 6 semanas.

Semanas de trabajo desde el arranque, con **seguimiento a 30, 60 y 90 días** desde el cierre de la implementación.

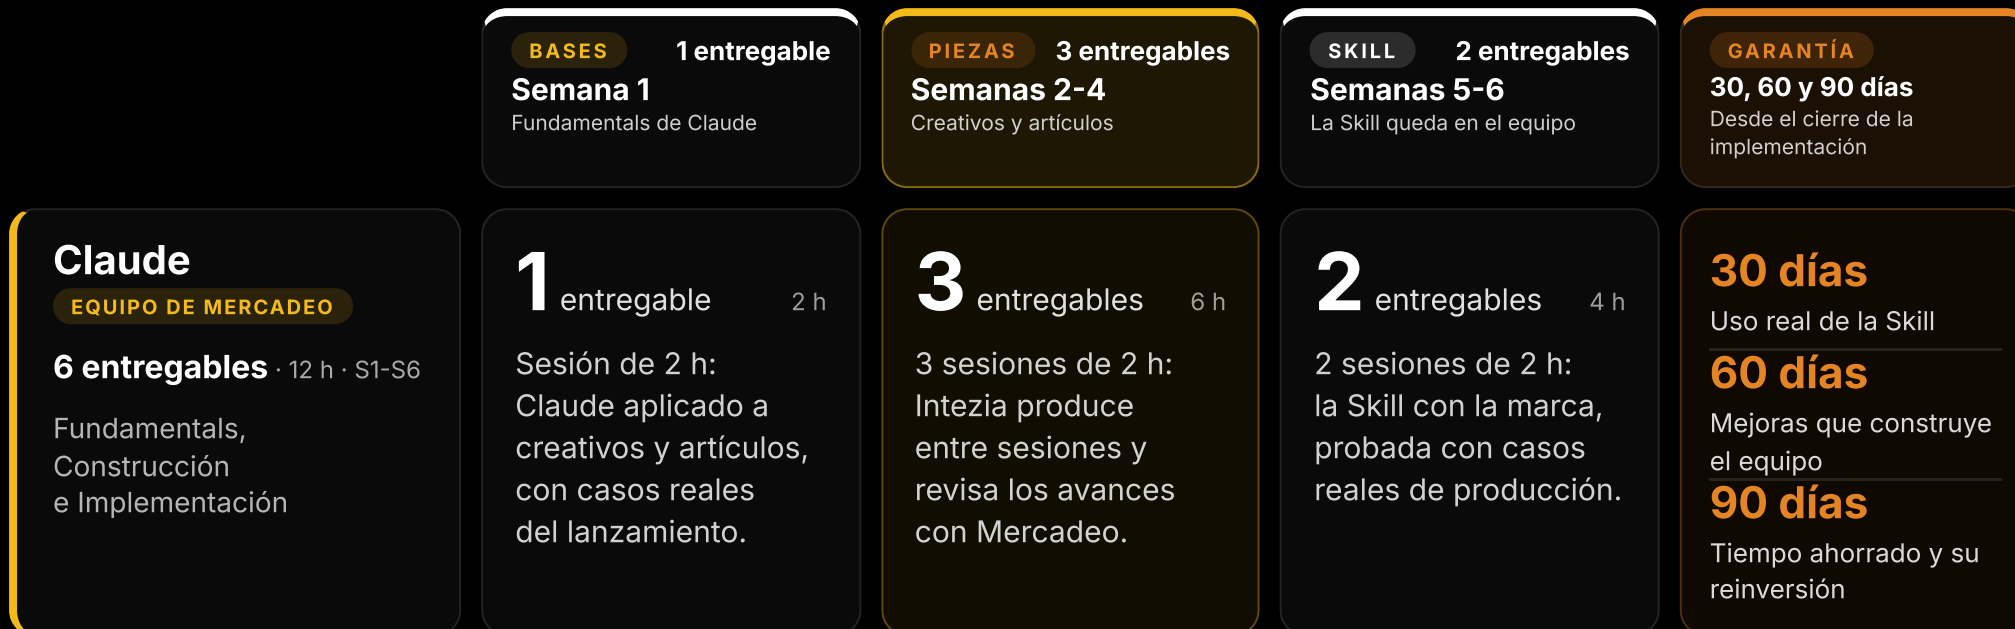

Kick-off · aparte

1 h con Mercadeo para levantar marca, calendario de lanzamiento y productos prioritarios.

S1 · Fundamentals

2 h con el equipo: Claude aplicado a creativos y artículos.

S2-S4 · Construcción

3 revisiones de 2 h: Intezia produce entre sesiones y ajusta con Mercadeo.

S5-S6 · Implementación

2 sesiones de 2 h: la Skill con la marca, probada con casos reales.

30 · 60 · 90 días

Seguimiento: uso de la Skill, nuevas construcciones y tiempo ahorrado.

S = semana de trabajo desde el arranque, cuya fecha se acuerda con N58 Banco Digital. Las 12 h son una proyección de sesión: 2, 6 y 4 h en las fases 1, 2 y 3. El kick-off de 1 h es aparte y no suma horas, igual que la producción de Intezia entre sesiones.

Inversión por horas de sesión.

Propuesta Económica · Servicio de Habilidades

DURACIÓN

12 h de sesión presencial en 6 semanas de trabajo, más un kick-off de 1 h aparte.

PROGRAMA

Producción del contenido de lanzamiento con Claude y una Skill propia para Mercadeo de N58 (CAI-034).
Fundamentals (2h) + Construcción (3 sesiones de 2h) + Implementación (2 sesiones de 2h).
12h totales de sesión presencial, más 1h de kick-off aparte. Cobertura: equipo de Mercadeo.

NOTAS

Se integra al calendario de lanzamiento ya en marcha del banco, no a un presupuesto de mercadeo aparte.
Modalidad presencial, coordinada con el equipo de Mercadeo. La producción de Intezia entre sesiones no suma horas de sesión.
Las licencias de Claude no están incluidas en esta propuesta.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

-\$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

GARANTÍA 30-60-90

Estamos contigo hasta que la habilidad quede instalada.

Lo que recibe Mercadeo.

Lo que se llevan: **6 entregables** trabajados con el equipo de Mercadeo, más el seguimiento a 30, 60 y 90 días que mide su efecto.

CLAUDE · 6 ENTREGABLES

Fundamentals

1

- Equipo de Mercadeo nivelado en Claude

Construcción

3

- Primer avance de creativos y artículos, revisado
- Segundo avance de creativos y artículos, ajustado
- Más de 50 creativos y 4 artículos publicados

Implementación

2

- Skill de Claude con la marca de N58
- Skill probada y 1 persona formada para operarla

ENTREGABLES TRANSVERSALES

- Plan de piezas del lanzamiento, acordado en el kick-off.
- Línea base del tiempo actual de producir cada pieza.
- Seguimiento a 30, 60 y 90 días con medición del tiempo.

VALOR INMEDIATO

- Semana 1: equipo con un lenguaje común de Claude.
- Semana 4: más de 50 creativos y 4 artículos del lanzamiento.
- Semana 6: Skill con la marca y 1 persona formada.

Retorno esperado: tiempo y dinero.

Se calcula con los datos de Mercadeo, se confirma con la línea base de la semana 1 y se mide a 30, 60 y 90 días.

CÓMO SE CALCULA, POR PIEZA

- 1

Volumen semanal
Cuántos creativos y artículos produce Mercadeo cada semana.
- 2

Tiempo actual por pieza
Se mide con el equipo en la primera sesión y es la **línea base**.
- 3

Tiempo con la Skill
Lo que toma la misma pieza con Claude y la Skill, ya en uso.
- 4

Horas recuperadas a la semana
Volumen semanal multiplicado por la diferencia entre el tiempo actual y el tiempo con la Skill.
- 5

Valor en dinero
Horas recuperadas multiplicadas por el costo hora de referencia que N58 valide.

METAS, DESDE EL CIERRE DE LA IMPLEMENTACIÓN

- 30 días**

La Skill en uso real en la producción de creativos y artículos.
- 60 días**

Variantes y mejoras que construye el equipo y horas recuperadas medidas contra la línea base.
- 90 días**

Medición del tiempo recuperado, su valor en dinero y en qué se reinvierte.

HACIA DÓNDE VA EL TIEMPO RECUPERADO

- Mismo equipo, más piezas**

Si el tiempo se libera, Mercadeo puede producir **más creativos y artículos** con el mismo equipo.
- Más posicionamiento**

Con el tiempo liberado, el equipo puede profundizar su posicionamiento en buscadores.
- Más allá del lanzamiento**

La Skill sigue produciendo piezas y artículos en las **campañas** que vienen después.

Hacia la semana 19 (6 semanas de trabajo más 90 días de seguimiento), N58 contará con el tiempo recuperado por Mercadeo medido y su valor en dinero.
